
Burnup: horas estimadas

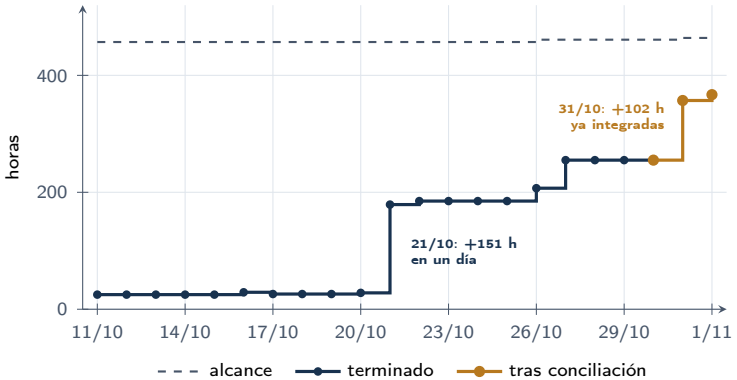


79 %
367 de 466 h

72 %
89 de 123 tarjetas

Los saltos no son días productivos: el tablero se actualizó por lotes.

Flujo acumulado (CFD)

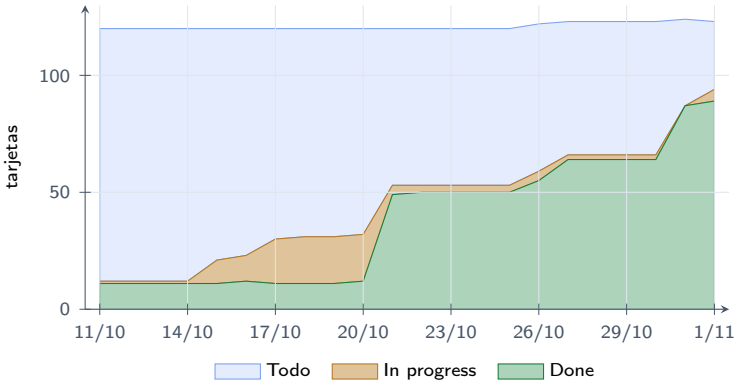

Lectura

- 15–20/10: 20 tarjetas en curso a la vez.
- 21/10: 37 pasan a Done juntas.
- 22–30/10: casi nada en In progress; el trabajo avanzó sin mover el tablero.
- 01/11: las 5 tarjetas de E3 en curso ya se ven.

Tiempos y estimado vs. real

Días	n	Mediana	Máx.
Lead time	63	4,4	23,0
Cycle time	21	3,9	5,9

Lead time: creada → Done. Cycle time: In progress → Done. Excluye 26 tarjetas conciliadas o registradas después de hechas: su fecha de Done es la de la conciliación, no la del trabajo.

Semana	Est.	Real	Real/est.
1	37	25	0,68
2	15	14	0,93
3	28	23	0,82
4	9	9	1,00
Total	**89**	**71**	**0,80**

Solo 30 de 89 tarjetas Done tienen `Real (h)`. En ellas sobrestimamos cerca de un 20 %: 16 bajo lo estimado, 11 iguales y 3 sobre.
