
Burnup: horas estimadas

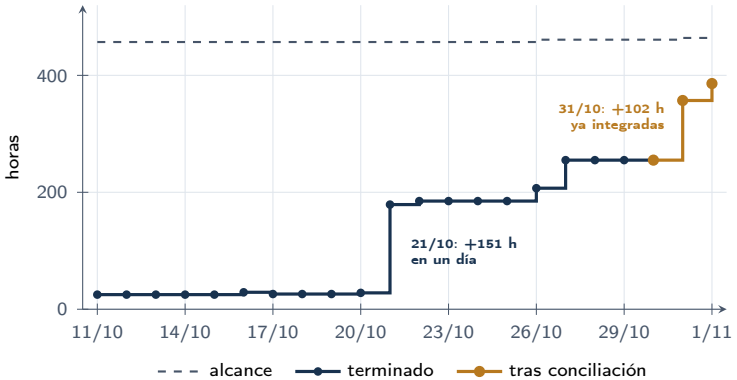


83 %
386 de 465 h

78 %
96 de 123 tarjetas

Los saltos del 21/10 y del 31/10 corresponden a actualizaciones del tablero por lotes.

Flujo acumulado (CFD)

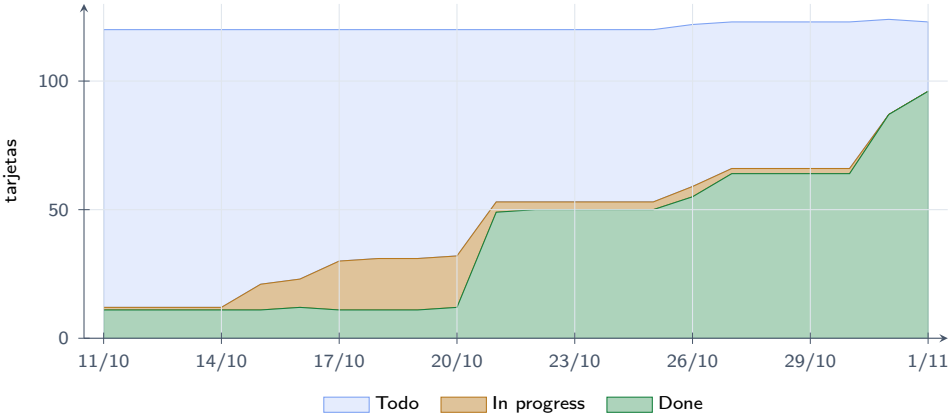

Tiempos y estimado vs. real

En días	Tarjetas	Mediana	Máx.
Lead time	70	3,3	23,0
Cycle time	21	3,9	5,9

Tarjetas: cuántas entran al cálculo. Lead time: creada → Done. Cycle time: In progress → Done. Excluye 26 tarjetas conciliadas o registradas después de hechas: su fecha de Done es la de la conciliación, no la del trabajo.

Semana	Est.	Real	Real/est.
1	37	25	0,68
2	37	26	0,70
3	130	45,6	0,35
4	33	22	0,67
Total	**237**	**118,6**	**0,50**

68 de 96 tarjetas Done tienen `Real (h)`. En ellas el real fue la mitad de lo estimado: 47 bajo lo estimado, 18 iguales y 3 sobre. Las 28 sin horas son casi todas funcionalidades de las semanas 5 y 6, registradas al conciliar.
