
¿Alcanzamos? Sí, con margen para el MVP comprometido

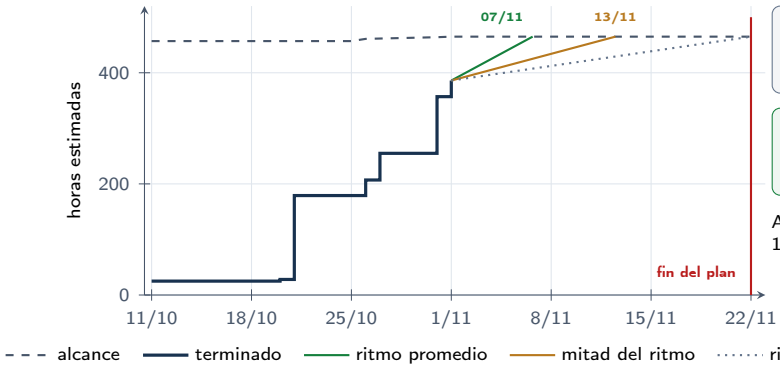

26 h/sem
necesarias para 79 h en 3 semanas

97 h/sem
promedio observado (386 h en 4 sem.)

Aun a la mitad del ritmo terminamos el 13/11, nueve días antes del cierre.

Supuestos y riesgos de la proyección

Por qué creemos el número

- El producto va adelantado: 133 h planificadas para las semanas 5 y 6 ya están en Done.
- Lo pendiente es poco código: 34 h de entregas y gestión, 21 h de material en archivos (P2) y 8 h de tests de aislamiento.
- Estimamos holgado: en las 68 tarjetas con horas reales, el real fue la mitad de lo estimado (0,50).

Qué puede fallar

- **Calendario:** 48 h son de la semana 7 (ensayo, retro, release) y no se pueden adelantar.
- **Render:** la base free vence cerca del 21/11, en plena semana 7 (#178).
- **Medición:** 68 de 96 tarjetas Done tienen horas reales; faltan casi todas las funcionalidades conciliadas de las semanas 5 y 6.

P0 + P1: 58 h, alcanzamos **P2 material en archivos: 21 h, condicionado al storage**
